CAMMESA

Previsión Semanas 19 y 20/24
Despacho Energético

Gerencia de Coordinación Operativa, 10/05/24

Escenario previsto



Se considera menor disponibilidad de Gas nacional para Usinas y mayor requerimiento de recursos alternativos más costosos (Importación, GNL, y alternativos al gas), por NOTA Secretaría de Energía NO-2024-44424318-APN-SE, la cual instruye ENARSA a priorizar el uso del Gasoducto PNK para la demanda ininterrumpible de las Distribuidoras de Gas, siempre que ésta identifique necesidades.

Importación: Se prevé importación comercial desde Chile, Bolivia y Uruguay; por ser competitiva contra el marginal de nuestro sistema. Brasil: En costo, pero sin disponibilidad restringida por indisponibilidad en red de transmisión brasilera.

Exportación: BRASIL y URUGUAY: Se realiza oferta con confirmación diaria.

Gas y Combustible alternativo: Se prevé un gas de 38.5 Mm3 para esta semana y 32 Mm3 para la semana próxima. El despacho de la próxima semana lo completa: 37.000 Tn de FO, 65.000 m3 de GO y 26.000 Tn de CM.

Salto Grande: 13 unidades disponibles. Aportes medios para la semana próxima en el orden de los 23.000 m3/s.

Yacyretá: Opera con despacho empuntado, con entrante en descenso, cerrando la semana próxima con un promedio en el orden de 9.000 m3/s. ANDE toma 400 MW en horario de pico, con sistema Itaipú/ANDE/Yacyretá desacoplados.

Comahue: Caudales entrantes: Limay 135 m3/s, Collón Curá 190 m3/s y Neuquén 110 m3/s, con tendencia decreciente.

Chañar: Erogado en 220 m3/s por optimización de mediano plazo.

Arroyito: Erogado sube por gradiente hasta los 600 m3/s por optimización de mediano plazo.

Futaleufú: Despacho completo por optimización de mediano plazo.

Pronóstico de temperaturas en Buenos Aires (fuente SMN)

10.4°C

Despejado

Actualizado: 06h

Humedad: 84 %

Presión: 1013.8 hPa

Viento: Noreste a 1 km/h

Visibilidad: 10 km

Sol

07:37

18:03

Fuente SHN

Pronóstico para los próximos 7 días

Pronóstico oficial del día viernes, 10 de Mayo de 2024 - actualizado a las 05:46 horas

Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves
Mín 10°C	Mín 10°C	Mín 8°C	Mín 7°C	Mín 6°C	Mín 6°C	Mín 7°C
Máx 17°C	Máx 17°C	Máx 15°C	Máx 15°C	Máx 15°C	Máx 17°C	Máx 17°C

Viernes, 10 de Mayo de 2024

	Mañana	Tarde	Noche
Tiempo	Parcialmente nublado	Mayormente nublado	Mayormente nublado
Prob. Precipitación	0%	0 - 10%	0%
Temperatura (°C)	14	17	13
Viento (km/h)	7 - 12	7 - 12	7 - 12
Dirección Predominante	NE	E	SE
Ráfagas (km/h)	-	-	-

Pronóstico de temperaturas en Buenos Aires (fuente Weather Channel)

Hoy	16°/10°	Parcialmente nublado	5%	E 11 km/h
sáb 11	17°/10°	Mayormente soleado	8%	SE 21 km/h
dom 12	14°/7°	Chubascos	82%	SSE 24 km/h
lun 13	13°/5°	Mayormente soleado	17%	S 20 km/h
mar 14	13°/5°	Mayormente soleado	7%	SO 12 km/h
mié 15	14°/7°	Parcialmente nublado	6%	OSO 13 km/h
jue 16	15°/8°	Parcialmente nublado	6%	OSO 12 km/h
vie 17	15°/9°	Mayormente soleado	7%	SE 8 km/h
sáb 18	15°/9°	Parcialmente nublado	7%	E 8 km/h
dom 19	16°/10°	Soleado	7%	NNO 12 km/h
lun 20	16°/11°	Parcialmente nublado	13%	NNE 13 km/h
mar 21	16°/12°	Parcialmente nublado	24%	ENE 15 km/h
mié 22	15°/11°	Chubascos	41%	ESE 16 km/h
jue 23	15°/10°	Chubascos matinales	37%	SSE 17 km/h
vie 24	14°/9°	Parcialmente nublado	24%	SO 18 km/h

Situación parque generador

CENTRAL	MAQUINA	ESTADO	FECHA	MOTIVO
TERMOANDES	TG02	Indisponible	25-may	Mantenimiento Estacional
	TV01	Indisponible	14-may	Mantenimiento Estacional
DOCK SUD	TG10	Indisponible	15-may	Mantenimiento Estacional. A partir del 13/05 comienza ensayos de disponb con GN y GO
EZEIZA	TG03	Indisponible	16-may	Mantenimiento Estacional. Continúa indisponible hasta el 26/05.
GRAL. BELGRANO	TG01	Indisponible	16-may	Mantenimiento Estacional
	TG02	Indisponible	23-may	Mantenimiento Estacional
	TV01	Indisponible	19-may	Mantenimiento Estacional
PUERTO	TG11	Indisponible	11 al 13-may	Mantenimiento Semanal
	TG12	Indisponible	10 al 12-may	Mantenimiento Semanal
	TV10	Indisponible	11 al 12-may	Mantenimiento Semanal
COSTANERA	TG08	Indisponible	27-may	Mantenimiento Estacional
V. MARIA DOS	TG02	Indisponible	16 al 20-may	Mantenimiento Estacional
	TG04	Indisponible	11 al 15-may	Mantenimiento Estacional
BARKER	TG04	Indisponible	16 al 17-may	Mantenimiento Semanal
NECOCHEA	TV01-02	Indisponibles	Sin previsión	
PUERTO	TV07-TV08	Limitadas	Sin previsión	a 130MW y 120MW por conservación de calderal
L.CAMPANA (AUTOGEN)	TG01	Indisponible	Sin previsión	
BRAGADO	TG03	Indisponible	10-may	Mantenimiento Estacional. Solicita extensión hasta el 26/05
SARMIENTO DE CUYO	TG22	Indisponible	9-jun	Mantenimiento Estacional
ING. WHITE	U03	Indisponible	13-may	Mantenimiento Estacional
	U02	Indisponible	14 al 21-may	Mantenimiento Estacional
LA RIOJA	TG23	Indisponible	14 al 15-may	Mantenimiento Semanal
	TG22	Indisponible	16 al 17-may	Mantenimiento Semanal

Situación parque generador

CENTRAL	MAQUINA	ESTADO	FECHA	MOTIVO
YACYRETÁ	U04	Indisponible	31-jul	Mantenimiento Estacional.
	U08	Indisponible	18-may	Mantenimiento Estacional.
	U14	Indisponible	1-jul	Mantenimiento Estacional.
SALTO GRANDE	U06	Indisponibles	14-may	Mantenimiento Estacional
P.BANDERITA	U02	Indisponible	Sin previsión	
CHOCON	U06	Indisponible	27-may	Mantenimiento Estacional
ALICURA	U04	Indisponible	13 al 19-may	Mantenimiento Estacional
	U02	Indisponible	20 al 26-may	Mantenimiento Estacional
RIO GRANDE	U01 - U04	Indisponibles	Sin previsión	Continúan indisponibles por Falla Estatórica
	U03	Indisponible	1-jun	Mantenimiento Estacional
NIHUILES	U205	Indisponible	17-may	Mantenimiento Estacional
	U204	Indisponible	13 al 31-may	Mantenimiento Estacional
	U101	Indisponible	16-may	
PUNTA NEGRA	U01	Indisponible	15-may	Mantenimiento Estacional
	U02	Indisponible	17-may	Mantenimiento Estacional
CABRA CORRAL	U01	Indisponible	2-jun	Mantenimiento Estacional

Perspectivas para la próxima semana

		Semana 19		Semana 20	
		6/5/2024 - 12/5/2024		13/5/2024 - 19/5/2024	
		Gwh	MWmed	Gwh	MWmed
Balance Semanal	Demanda	2678	15942	3079	18330
	Exportación	0	0	0	0
	Térmico	1412	8403	1690	10059
	Hidráulico	640	3808	734	4370
	Nuclear	286	1701	286	1703
	Renovable	290	1727	311	1849
	Importación	57	339	59	349

	Tipo	Unidad	Semana 19	Semana 20
Consumo Combust.	Gas	Mm3/día	38.5	32
	FO	Miles de Ton	6	37
	GO	Miles de m3	2	65
	Carbón	Miles de Ton	10	26

Despacho MW med	ALICURA	135	311
	PIEDRA	316	552
	CHOCON	167	351
	P.BANDERITA	149	137
	FUTALEUFÚ	480	545
	SALTO	455	596
	YACYRETA	1684	1268

		Hoy	Domingo	Domingo
Niveles (msnm)	ALICURA	704.26	704.42	702.72
	PIEDRA	585.59	585.58	585.28
	CHOCON	377.70	377.68	377.61
	P.BANDERITA	413.51	413.40	413.23
	FUTALEUFÚ	488.15	487.42	486.07
	SALTO	31.99	33.67	33.44

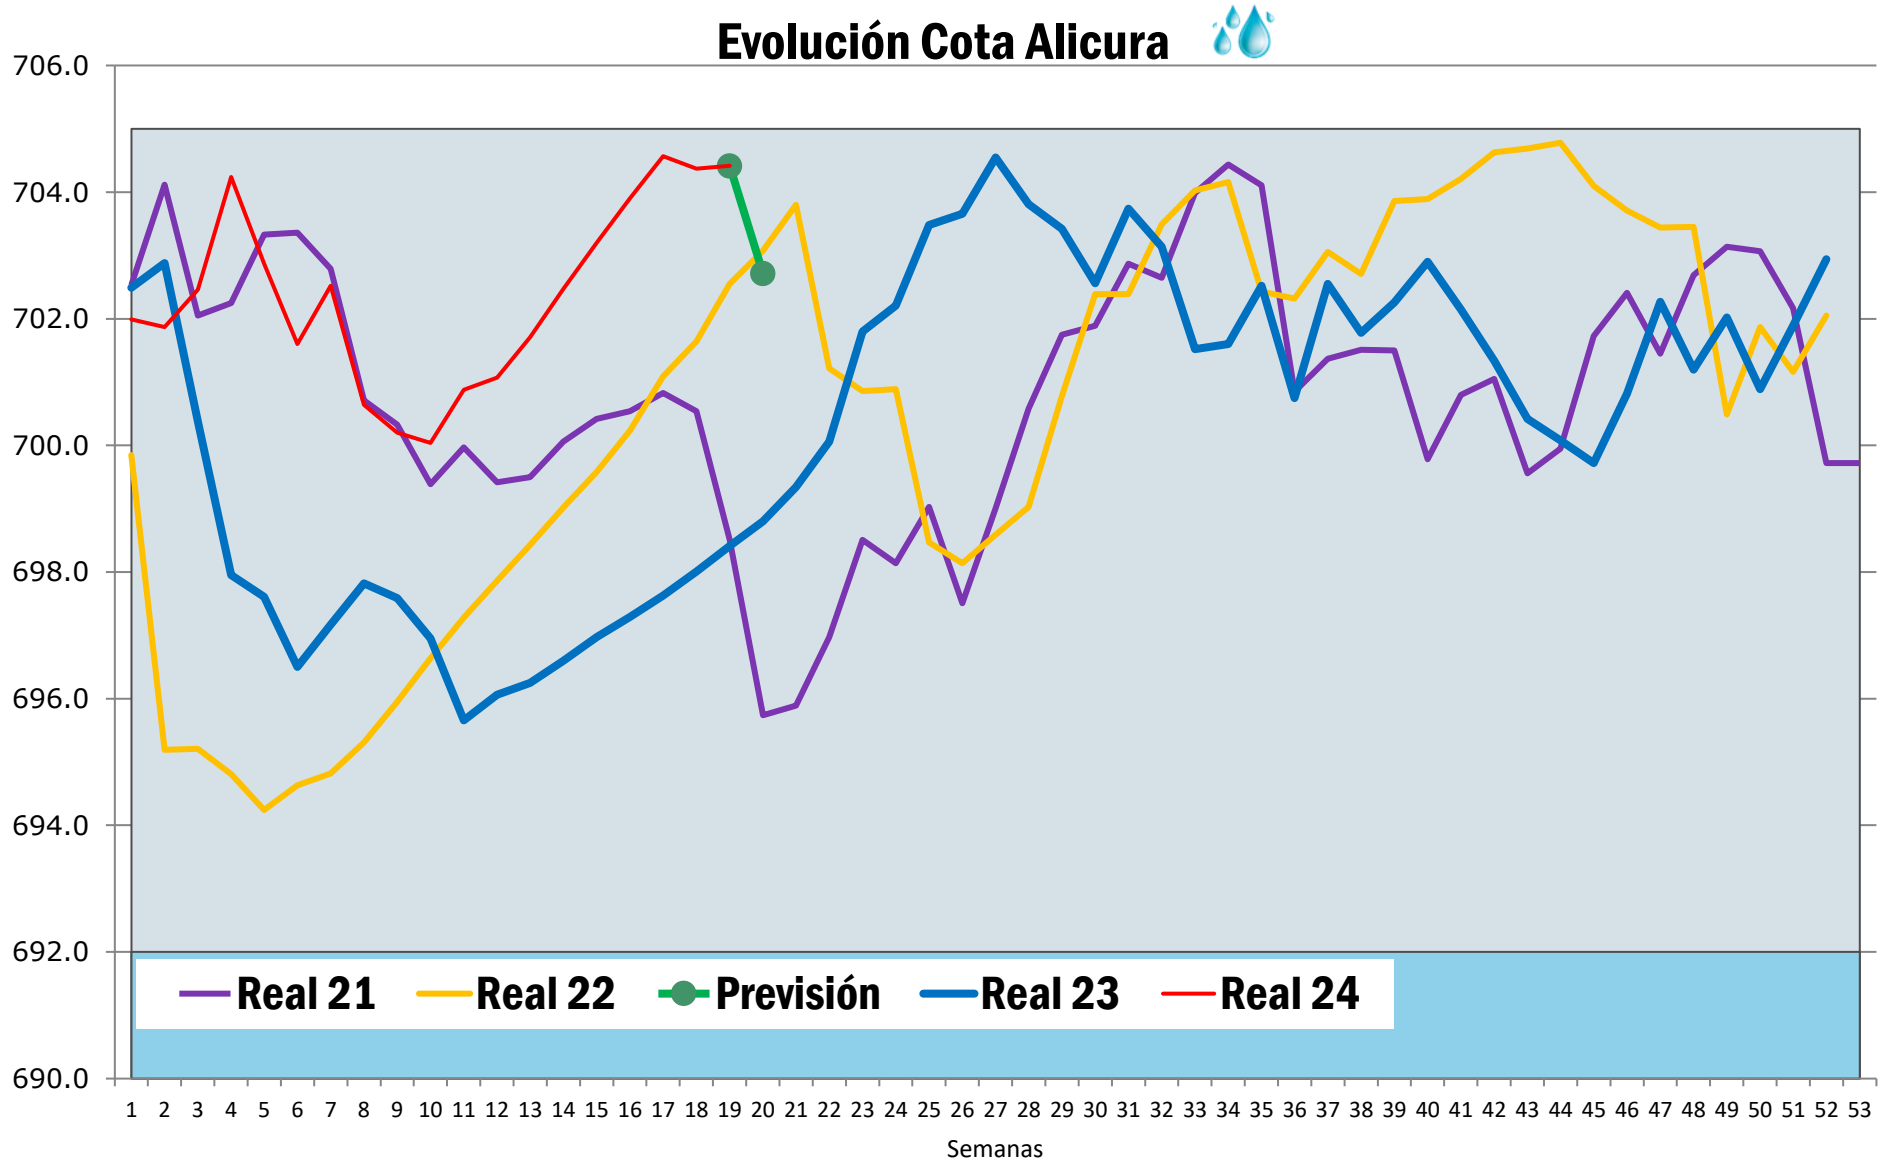
Evolución Cota Alicura
706.0
704.0
702.0
700.0
698.0
696.0
694.0
692.0
690.0
Real 21
Real 22
Previsión
Real 23
Real 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Semanas

Evolución Cota Piedra del Águila

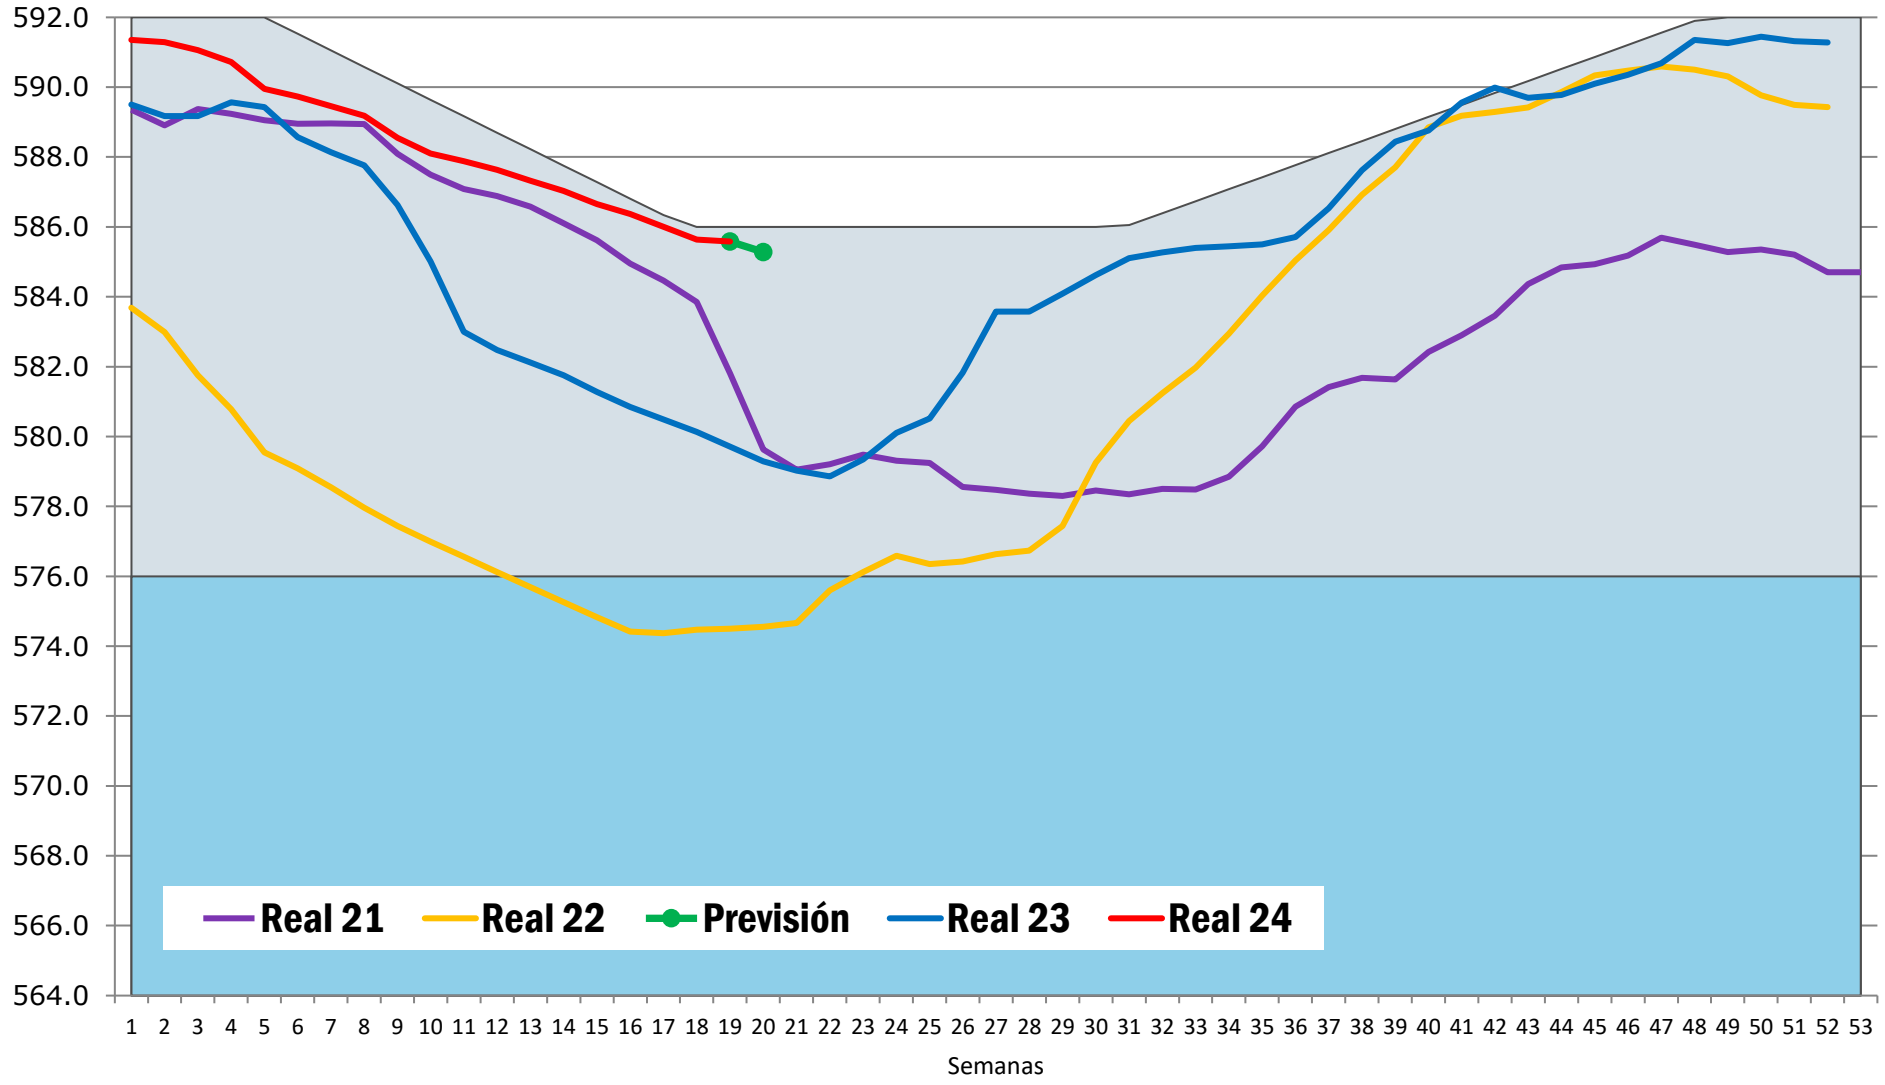

Evolución Cota Chocón

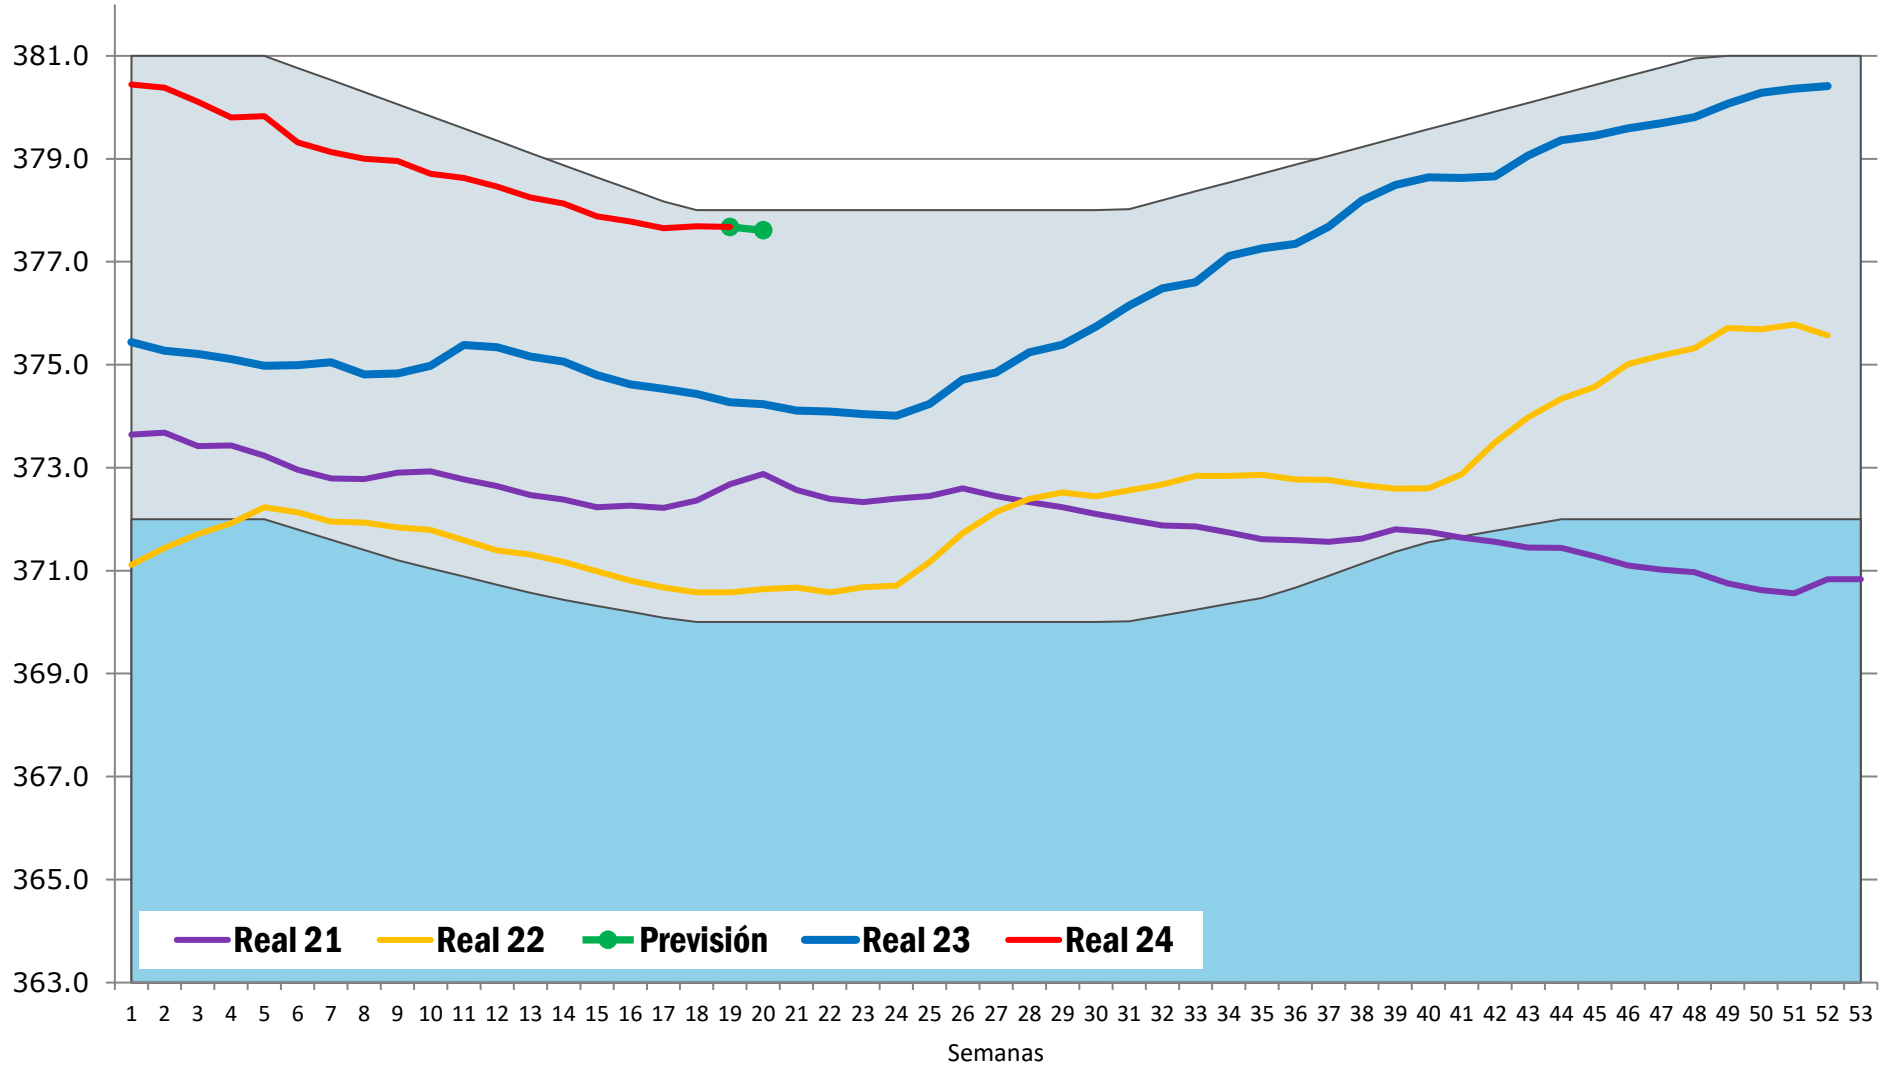

Evolución Cota Planicie Banderita

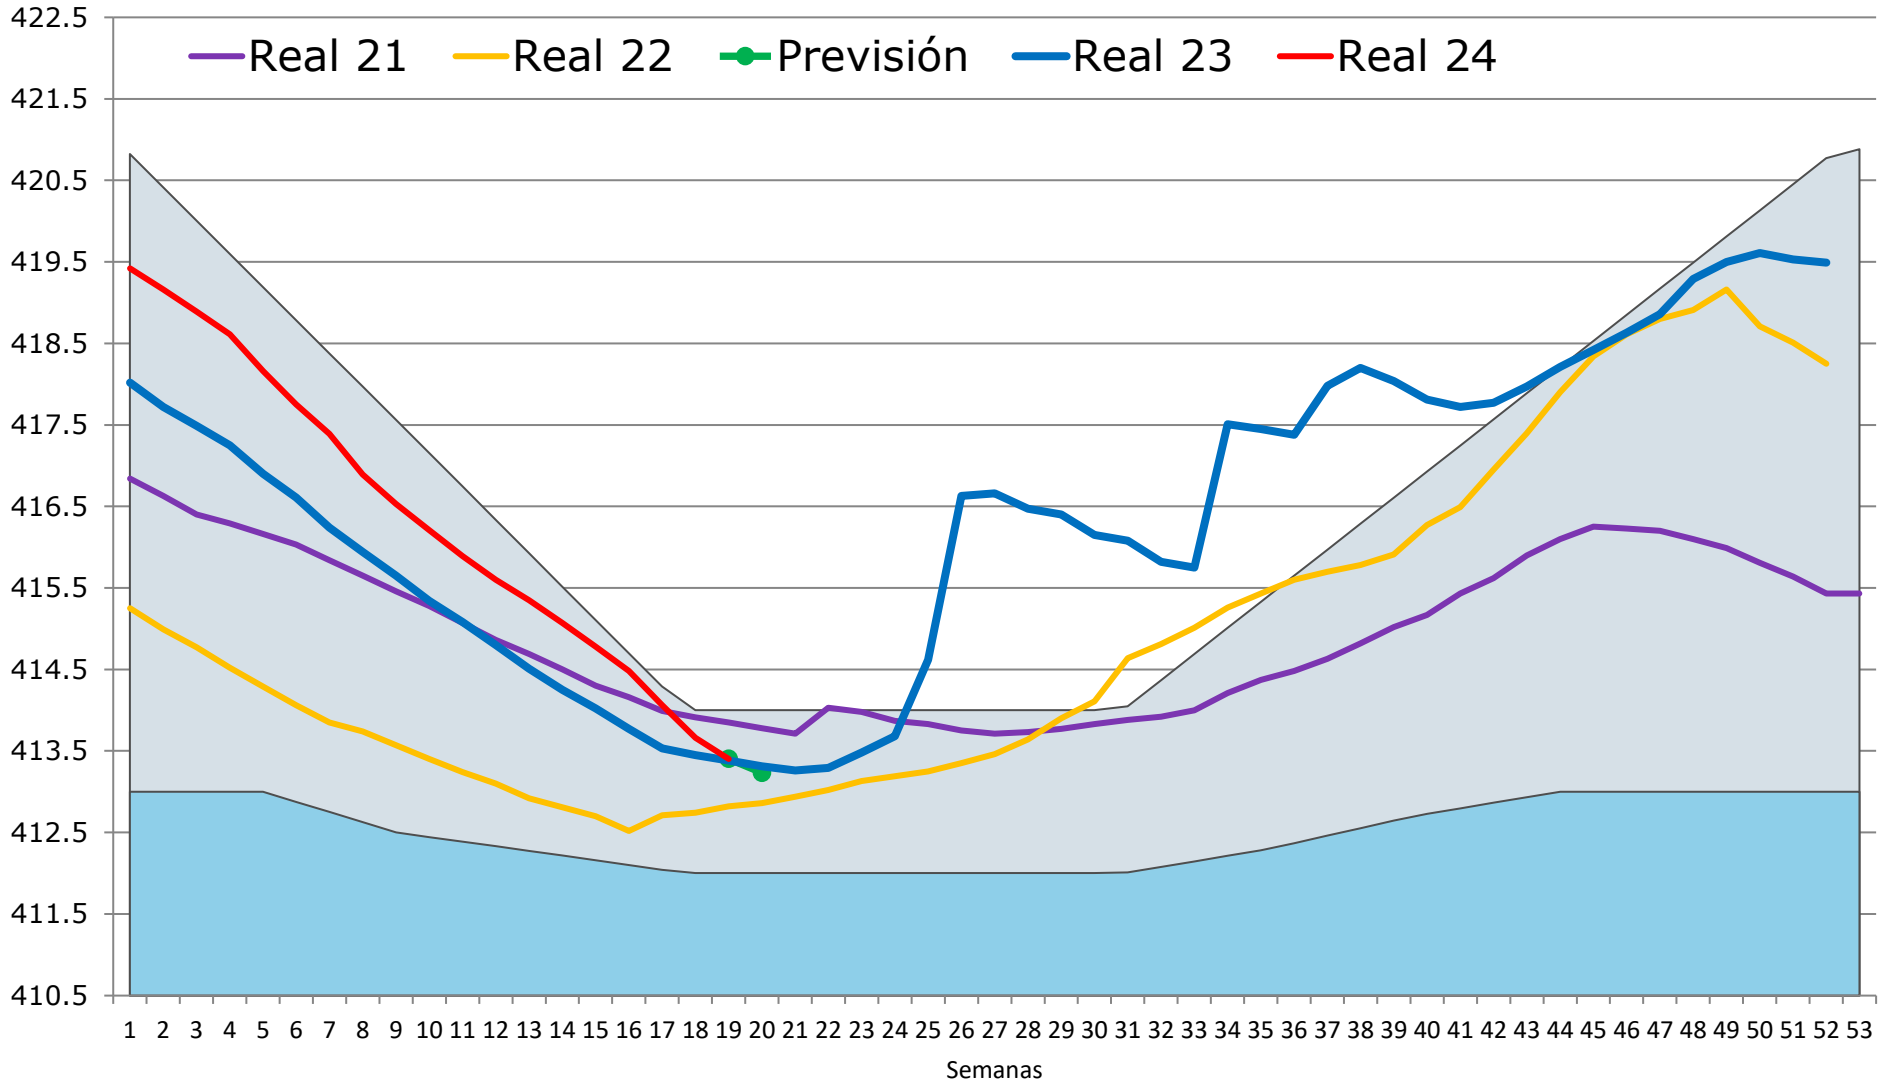

Evolución Cota Futaleufú

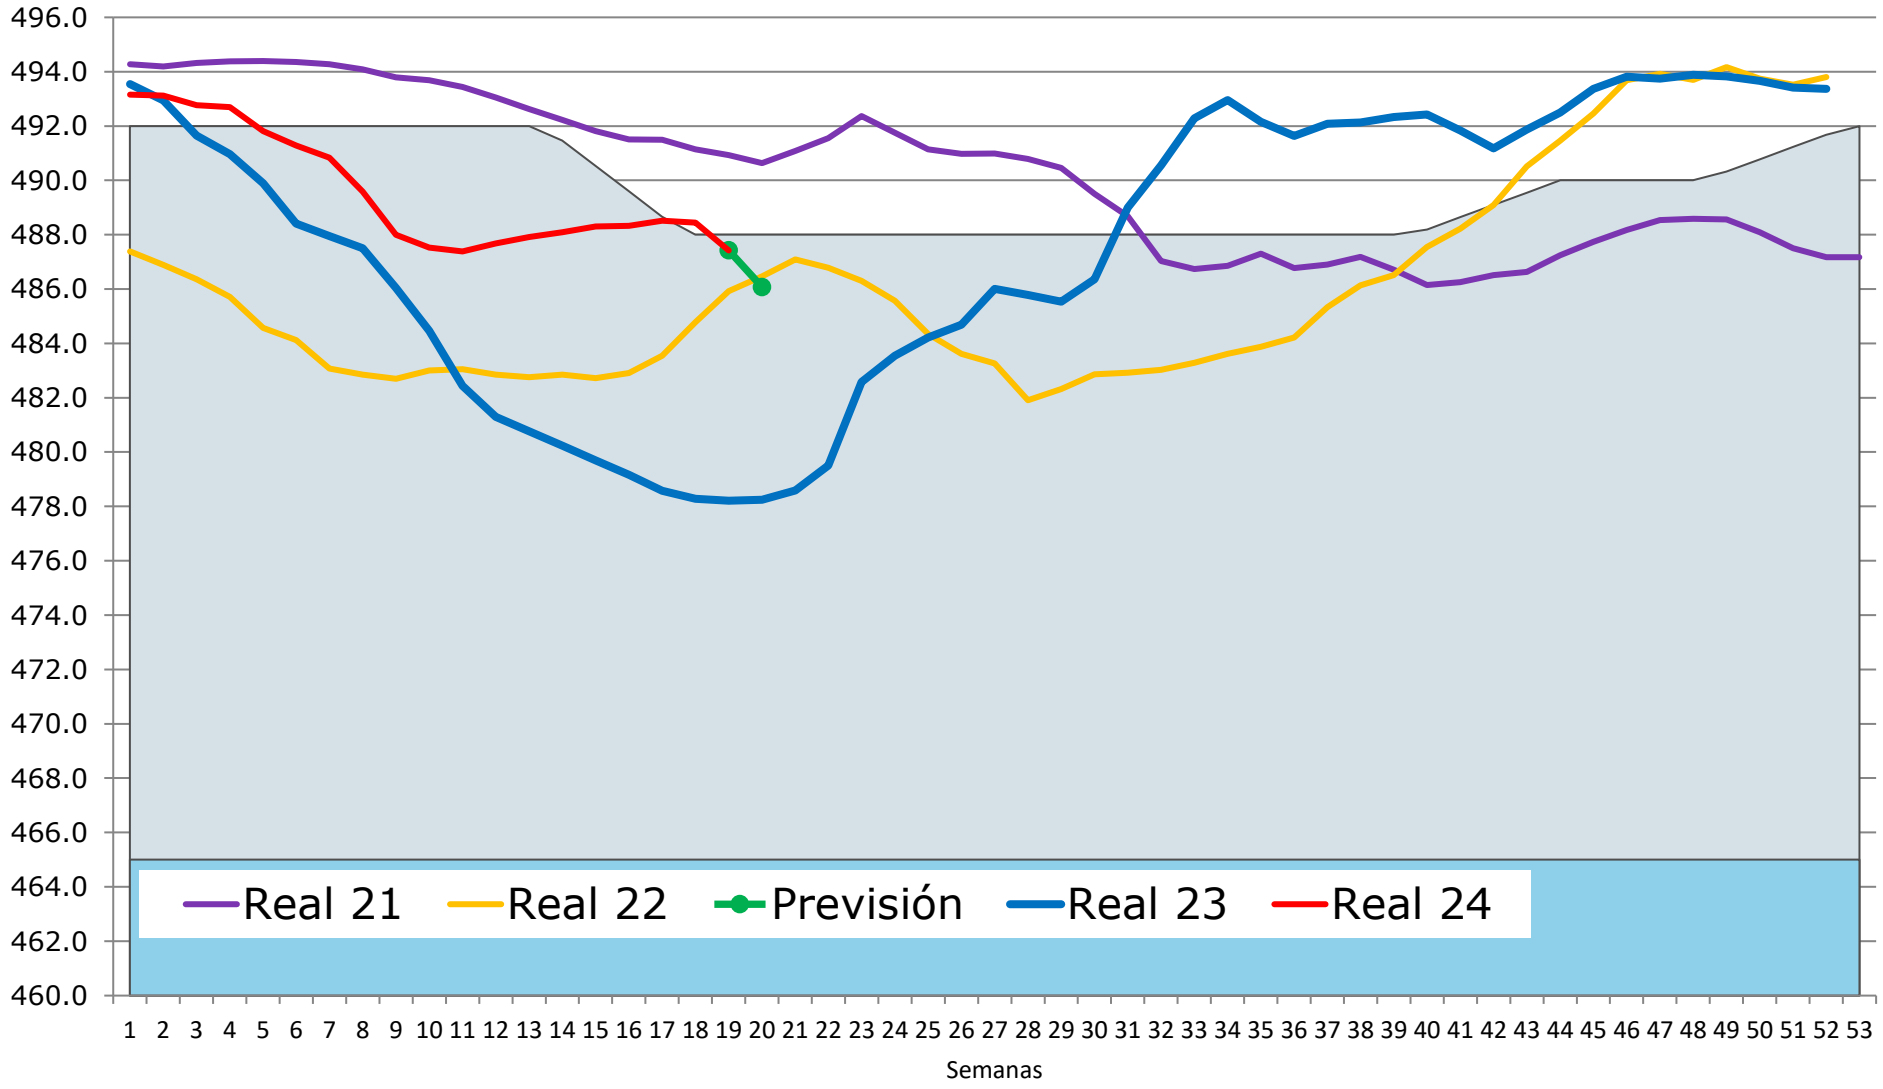

Sistema de Transporte y Distribución – Semana 20

Condiciones previstas de Operación en el STAT (Sistema de Transporte en Alta Tensión):

Normales → Particulares Programadas → Anormales → De Emergencia

Equipos del STAT indisponibles:

- F/S indisponible la Interconexión de 220 kV Clorinda (ARG) – Guarambaré (PAR), por torre caída, sin previsión de disponibilidad.
- F/S indisponible el Compensador Sincrónico N°3 de la E.T. Ezeiza, para mantenimiento. **Los trabajos están demorados, sin previsión de disponibilidad.**
- F/S indisponible el Compensador Sincrónico N°4 de la E.T. Ezeiza, para mantenimiento. **Los trabajos están demorados, sin previsión de disponibilidad.**
- Continúa F/S desde el 18/04 el Compensador Sincrónico N°2 de la E.T. Ezeiza, para mantenimiento, previsto hasta el 22/05.

Sistema de Transporte y Distribución – Semana 20

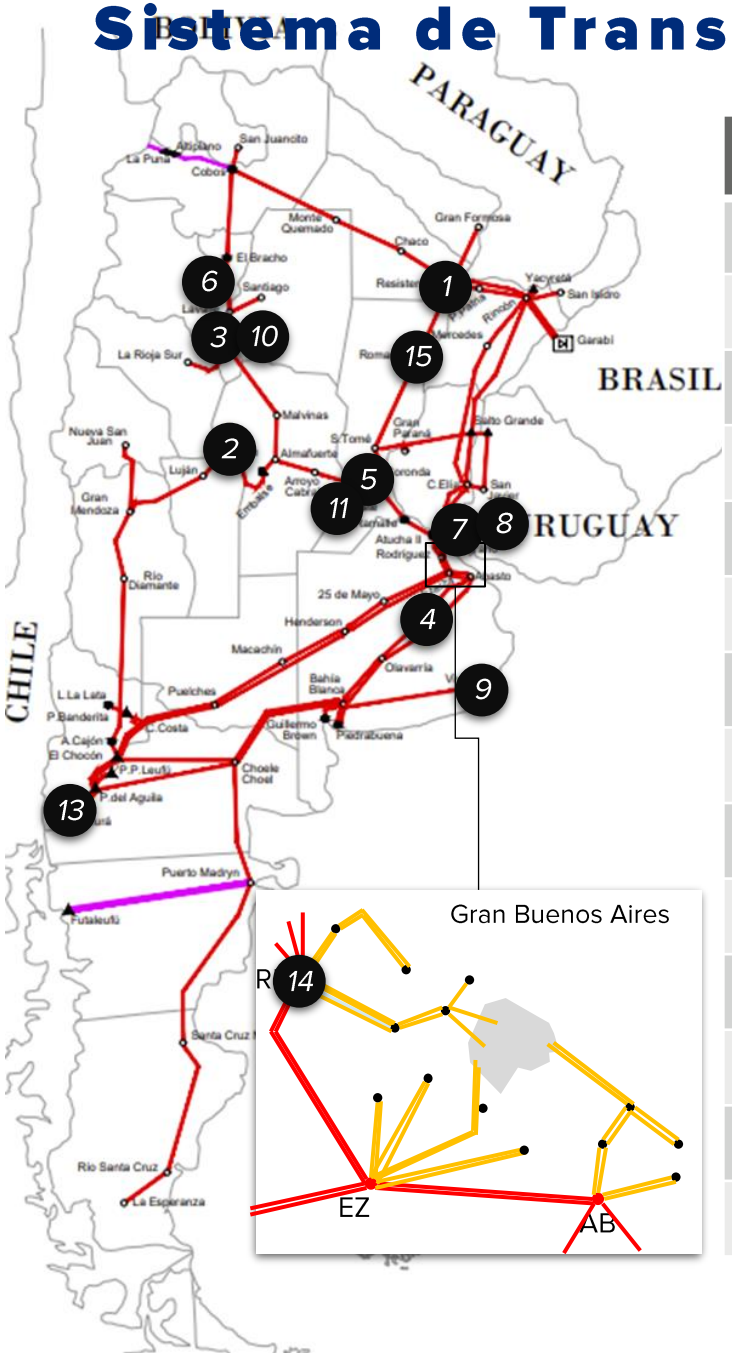

TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS RELEVANTES

#	EQUIPO	PROPIETARIO	TRABAJO	S 11	D 12	L 13	M 14	M 15	J 16	V 17
1	**Transformador N°1 (500/132 kV – 300 MVA) de ET Resistencia**	TRANSENER	Mantenimiento estacional control de accesorios maquina	X	X					
2	**Transformador N° 2 (500/16.5 kV – 440 MVA) de ET Río Grande**	TRANSENER	Cambio por los nuevos interruptores de máquina de las RG3 y RG4,	X	X	X	X	X	X	X
3	**Línea de 500 KV Recreo - Lavalle**	TRANSENER	Mantenimiento de equipos asociados	X	X					
4	**Línea de 500 kV Abasto - Olavarría 2**	TRANSENER	Poda de árboles próximos a la línea		X					
5	**Línea de 500 kV Coronda - Rosario Oeste 2**	TRANSENER	Para vinculación de disparos de reactor y puesta en servicio del mismo		X					
6	**Línea de 500 kV El Bracho – Lavalle**	TRANSENER	Mantenimiento General. Retiro de nidos y cambio de aislación	X	X					
7	**Acometida de 500 kV M. Belgrano – TG01**	TRANSENER	Mantenimiento anual	X	X	X				
8	**Acometida de 500 kV M. Belgrano – TV01**	TRANSENER	Mantenimiento anual	X	X	X				
9	**Transformador N°2 (500/132 kV – 300 MVA) de ET Vivoratá**	TRANSENER	Regulación de la celda de MT	X	X					
10	**Transformador 2 (500/132 kV – 300 MVA) de ET Recreo**	TRANSENER	Mantenimiento de protecciones eléctricas de transformador y PFI asociadas		X					
11	**Transformador 3 (500/132 kV – 300 MVA) de ET Rosario Oeste**	TRANSENER	Agregado de aceite		X					
13	**Transformador N°1 bloque (500/13,2 kV – 280 MVA) de ET CH Alicurá**	TRANSENER	para mantenimiento general al grupo G4.			X				
14	**Banco de Capacitores N°2 de ET Gral. Rodríguez**	TRANSENER	Mantenimiento			X				
15	**Transformador N°1 (500/132 kV – 150 MVA) de ET Romang**	TRANSENER	Ensayos de mantenimiento estacional de protecciones			X				

Sistema de Transporte y Distribución – Semana 20

Nuevas habilitaciones de Transporte por Distribución Troncal:

- Sin novedad.

Nuevo Equipamiento

- El 12/04/2024 se habilitó para la Operación Comercial en el MEM el Parque Solar Fotovoltaico “Victorica” (PAMPETROL S.A.P.E.M.), con una Potencia Máxima de 7,2 MW. Se conecta en 33 kV a la E.T. Victorica, jurisdicción de APELP en la provincia de La Pampa.

- El 29/04 quedó habilitado un nuevo equipo de Sincrofasores en ET Chocón Oeste (TRANSENER).

- El 04/05 se habilitó comercialmente en el MEM del Parque Solar Fotovoltaico Helios Santa Rosa II (TASSAROLI S.A.) por una potencia de 5.2 MW. Conectándose en la E.T. Santa Rosa (EDESTE), en la Provincia de Mendoza.
